



RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE CARNOT


Une nouvelle phase démarre

Fin de l'enfouissement des réseaux et début des aménagements

L'enfouissement des réseaux devant la mairie s'achèvera le 5 février.

À partir du 6 février, les travaux se concentreront sur la partie centrale de la place. Cette phase nécessitera la neutralisation de la partie gauche du parking, cela jusqu'au 19 février. Toutefois, la rue située à l'Ouest (côté CCAS) restera accessible à la circulation.

Durant cette période, le stationnement sera uniquement possible sur la partie droite du parking, avec une entrée et une sortie du même côté donnant sur la rue côté boulangerie (voir schéma). Le stationnement se fera en épi, mais le nombre de places sera réduit.

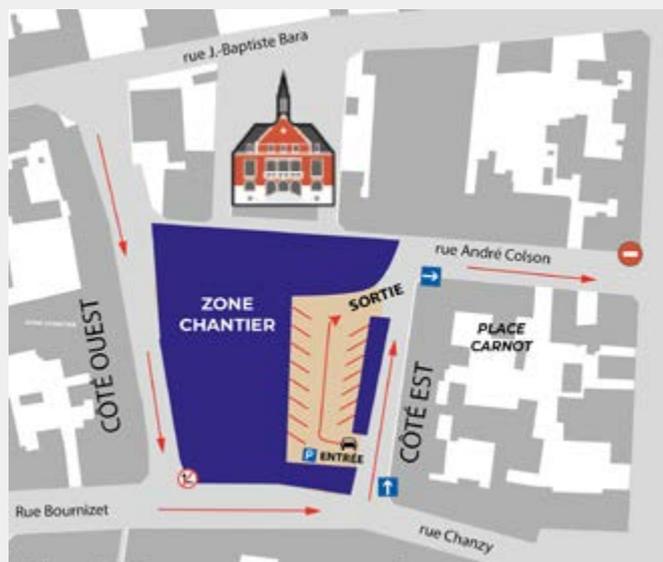

Zone chantier du 6 février au 19 février


Nouvelle phase : occupation en « demi-place »

À compter du 19 février, le chantier entrera dans une nouvelle phase, dite de « demi-place », définie en concertation lors des réunions publiques.

La circulation et le stationnement des véhicules seront interdits sur toute la partie gauche de la place jusqu'à l'achèvement des travaux, estimé à environ deux à trois mois. Les piétons pourront toujours emprunter les trottoirs pour accéder aux commerces.

Rappelons qu'initialement l'occupation par demi-place devait se dérouler sur 1 an (6 mois d'un côté, 6 mois de l'autre).

Ces opérations débuteront par le terrassement ainsi que des travaux de télécom menées par Orange et Losange jusqu'à la fin du mois de mars.

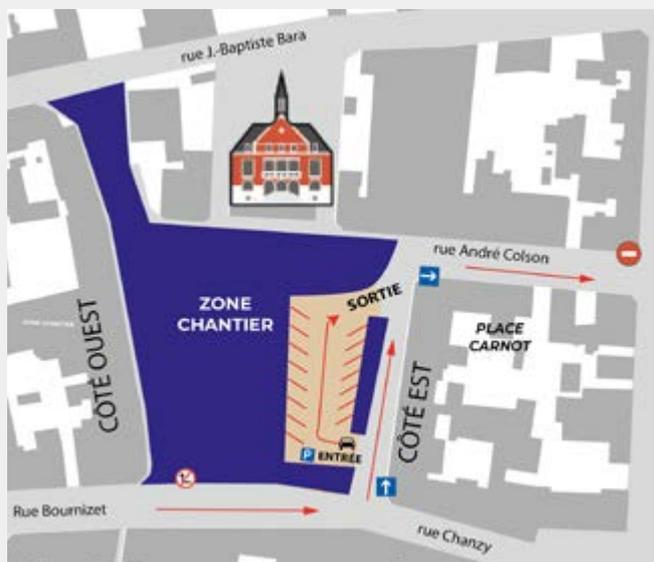

Zone chantier à partir du 19 février
